



Plan de Emergencia Habitacional

2022 - 2025



Informe A octubre 2023

Corte al 31.10.2023






**VIVIENDAS
TERMINADAS**
marzo 2022 a
octubre 2023

Meta a marzo 2026
260.000
Viviendas

Viviendas terminadas a
octubre 2023
85.704
Viviendas

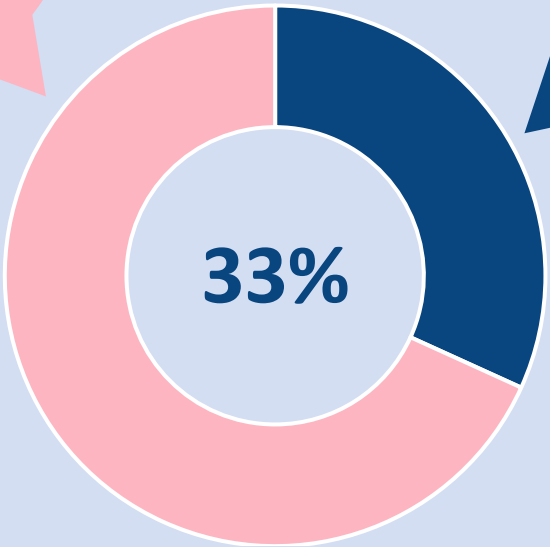

**Meta marzo
2026**

**Avance octubre
2023**

260.000

Terminadas

85.704

más de **100.000**

En ejecución

127.162

más de **40.000**

Por iniciar

78.847
proyectos aprobados
por iniciarse

Consideraciones: Viviendas terminadas: DS 49 y DS 10: Recepción SERVIU/DOM/GLOSA 6/Art. 5.2.7 OGUC; DS 19: Recepción Municipal total y parcial; DS 01: Reporte SIGFE; DS 49 adquisición: Reporte SIGFE ; DS 120: Resolución subsidio asignado.



VIVIENDAS TERMINADAS

marzo 2022 a
octubre 2023

Servicio	Meta PEH	Viviendas terminadas
Arica y Parinacota	7.540	1.783
Tarapacá	9.300	786
Antofagasta	17.400	1.452
Atacama	7.517	2.047
Coquimbo	12.490	4.908
Valparaíso	31.246	9.065
O'Higgins	14.667	4.592
Maule	16.667	9.322
Ñuble	6.557	3.447
Biobío	18.896	10.654
La Araucanía	13.533	7.359
Los Ríos	5.612	1.987
Los Lagos	14.165	4.471
Aysén	1.293	583
Magallanes	1.962	1.382
Metropolitana	81.155	21.866
Nacional	260.000	85.704




VIVIENDAS EN EJECUCIÓN SEGÚN AVANCE FÍSICO

% de avance físico						
Servicio	[0-25[[25-50[[50-75[[75-100[100%	Total
Arica y Parinacota	988	724	1.367	1.380	9	4.468
Tarapacá	2.377	305	19	2.104	1.115	5.920
Antofagasta	1.486	516	888	3.004	0	5.894
Atacama	1.567	509	124	1.610	15	3.825
Coquimbo	2.445	800	615	2.034	165	6.059
Valparaíso	5.182	1.367	2.017	4.727	1.476	14.769
O'Higgins	3.862	737	360	2.005	1.400	8.364
Maule	3.175	931	1.635	2.802	69	8.612
Ñuble	1.529	753	601	1.819	586	5.288
Biobío	3.019	1.244	1.744	3.283	475	9.765
La Araucanía	3.783	882	929	3.250	253	9.097
Los Ríos	769	477	598	962	0	2.806
Los Lagos	2.593	664	1.812	2.298	896	8.263
Aysén	470	109	7	129	3	718
Magallanes	1.561	523	64	514	0	2.662
Metropolitana	12.501	6.380	2.609	8.571	591	30.652
Nacional	47.307	16.921	15.389	40.492	7.053	127.162



VIVIENDAS EN PROCESO

Región	Viviendas terminadas	Viviendas en ejecución	Viviendas por iniciar	Viviendas en proceso
Arica y Parinacota	1.783	4.468	1.434	7.685
Tarapacá	786	5.920	2.327	9.033
Antofagasta	1.452	5.894	6.210	13.556
Atacama	2.047	3.825	1.627	7.499
Coquimbo	4.908	6.059	3.034	14.001
Valparaíso	9.065	14.769	7.895	31.729
O'Higgins	4.592	8.364	5.250	18.206
Maule	9.322	8.612	4.137	22.071
Ñuble	3.447	5.288	2.109	10.844
Biobío	10.654	9.765	5.546	25.965
La Araucanía	7.359	9.097	4.985	21.441
Los Ríos	1.987	2.806	1.465	6.258
Los Lagos	4.471	8.263	4.879	17.613
Aysén	583	718	149	1.450
Magallanes	1.382	2.662	175	4.219
Metropolitana	21.866	30.652	27.625	80.143
Nacional	85.704	127.162	78.847	291.713



Plan de Emergencia Habitacional

2022 - 2025

