




Plan de Emergencia Habitacional

2022 - 2025



Boletín a agosto 2025


Corte al 31.08.2025





VIVIENDAS TERMINADAS O ENTREGADAS

marzo 2022 a agosto 2025

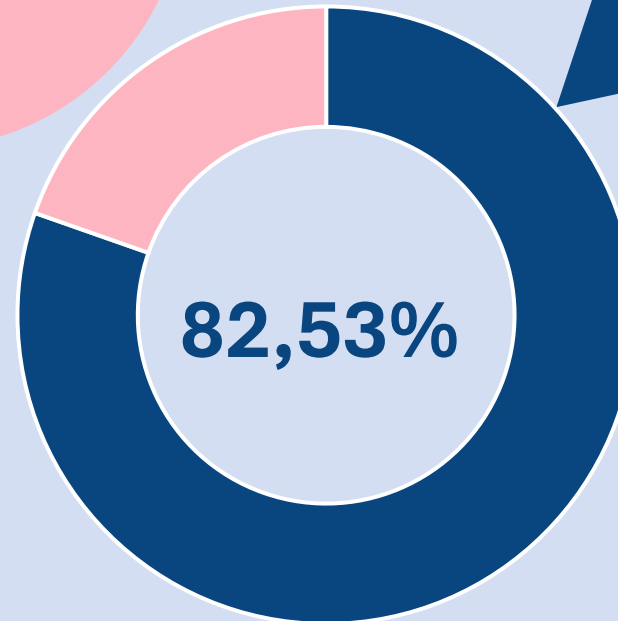

**Meta marzo
2026**

**Avance a agosto
2025**

260.000

Terminadas o entregadas

214.588

más de 100.000

En ejecución

127.428

Consideraciones: Viviendas terminadas: FSEV (DS 49) y Habitabilidad Rural (DS 10) construcción: Recepción SERVIU/DOM/GLOSA 6/Art. 5.2.7 OGUC; PIST (DS 19): Recepción Municipal total y parcial; SIS (DS 01): Reporte SIGFE; FSEV (DS 49) adquisición: Reporte SIGFE; Leasing (DS 120): Resolución subsidio asignado; Subsidios de arriendo permanentes para personas mayores y operaciones cursadas con FOGAES.

Destaca que entre marzo 2022 a agosto 2025 se han aplicado 22.770 subsidios de arriendo, 7.008 más que todo el período anterior (excluyendo llamado adulto mayor y asignaciones directas).



VIVIENDAS TERMINADAS O ENTREGADAS

marzo 2022 a agosto 2025

Servicio	Meta PEH	Viviendas terminadas o entregadas	% avance/meta
Arica y Parinacota	7.540	4.771	63,3%
Tarapacá	9.300	5.030	54,1%
Antofagasta	17.400	6.119	35,2%
Atacama	7.517	5.328	70,9%
Coquimbo	12.490	11.259	90,1%
Valparaíso	31.246	22.855	73,1%
O'Higgins	14.667	12.251	83,5%
Maule	16.667	21.533	129,2%
Ñuble	6.557	8.420	128,4%
Biobío	18.896	22.596	119,6%
La Araucanía	13.533	17.802	131,5%
Los Ríos	5.612	4.668	83,2%
Los Lagos	14.165	14.695	103,7%
Aysén	1.293	1.341	103,7%
Magallanes	1.962	3.099	158,0%
Metropolitana	81.155	52.821	65,1%
Nacional	260.000	214.588	82,5%

VIVIENDAS EN EJECUCIÓN SEGÚN AVANCE FÍSICO

% de avance físico							
Servicio	[0-25[	[25-50[	[50-75[	[75-100[	100%	Total	% distrib
Arica y Parinacota	1.206	66	1.193	1.521	123	4.109	3,2%
Tarapacá	1.997	687	866	1.012	51	4.613	3,6%
Antofagasta	3.144	608	628	1.067	288	5.735	4,5%
Atacama	973	474	452	1.299	13	3.211	2,5%
Coquimbo	2.330	1.353	774	1.331	11	5.799	4,6%
Valparaíso	5.325	1.934	1.451	3.339	115	12.164	9,5%
O'Higgins	2.984	2.133	745	3.166	36	9.064	7,1%
Maule	3.674	808	1.995	3.640	44	10.161	8,0%
Ñuble	1.905	734	601	1.680	437	5.357	4,2%
Biobío	1.903	1.811	1.381	4.048	314	9.457	7,4%
La Araucanía	3.453	629	1.665	2.187	157	8.091	6,3%
Los Ríos	532	168	261	561	108	1.630	1,3%
Los Lagos	3.422	1.289	948	2.200	98	7.957	6,2%
Aysén	284	192	116	268	43	903	0,7%
Magallanes	879	95	94	1.555	0	2.623	2,1%
Metropolitana	9.579	6.210	7.121	11.904	1.740	36.554	28,7%
Nacional	43.590	19.191	20.291	40.778	3.578	127.428	100,0%

VIVIENDAS EN PROCESO

Región	Viviendas terminadas o entregadas	Viviendas en ejecución	Viviendas por iniciar	Viviendas en proceso
Arica y Parinacota	4.771	4.109	1.688	10.568
Tarapacá	5.030	4.613	1.402	11.045
Antofagasta	6.119	5.735	1.334	13.188
Atacama	5.328	3.211	1.237	9.776
Coquimbo	11.259	5.799	3.086	20.144
Valparaíso	22.855	12.164	4.949	39.968
O'Higgins	12.251	9.064	2.492	23.807
Maule	21.533	10.161	1.442	33.136
Ñuble	8.420	5.357	1.739	15.516
Biobío	22.596	9.457	4.699	36.752
La Araucanía	17.802	8.091	4.034	29.927
Los Ríos	4.668	1.630	1.288	7.586
Los Lagos	14.695	7.957	3.681	26.333
Aysén	1.341	903	557	2.801
Magallanes	3.099	2.623	185	5.907
Metropolitana	52.821	36.554	24.712	114.087
Nacional	214.588	127.428	58.525	400.541
